PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 1 de 27



PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DE SISTEMA HVAC UMA-2

VETERQUÍMICA S.A.

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 2 de 27

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Se registran en la siguiente tabla todas las personas que han intervenido en este Protocolo de Mantenimiento de Estado Validado.

Preparado por:	Cargo	Firma	Fecha
Linda Paredes Abreu	Leading Senior Analyst CERCAL GROUP		
Sofia Camacho	Architect PMI CERCAL GROUP		
Revisado por:	Cargo	Firma	Fecha
Lucelly Perilla	Consultor Senior CERCAL GROUP		
Jonathan Ferrer	Head of SPOT CERCAL GROUP		
Raúl Quevedo	Auditor Regulatorio CERCAL GROUP		
Aprobado por:	Cargo	Firma	Fecha
Pablo Quiñones	Jefe de Aseguramiento de la Calidad VETERQUIMICA S.A.		

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2 VETERQUÍMICA S.A. Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01 Página 3 de 27

ÍNDICE

1	OBJETIVO	4
2	ALCANCE	. 4
3	RESPONSABILIDADES	. 4
4	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	. 5
5	PROCEDIMIENTOS	. 6
5.1	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN	7
5.2	PRUEBAS DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN	
5.3	ANÁLISIS DE RESULTADOS	21
6.	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
7.	REPORTE RESUMEN	21
8.	MANEJO DE DESVIACIONES	
9.	BIBLIOGRAFÍA	25
10.	ANEXOS	26

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01	
VETERQUÍMICA S.A.	Página 4 de 27	

1 OBJETIVO

Asegurar que el Sistema de HVAC, identificado como HVAC del área Producción Biológica Código interno UMA-2 y sus componentes individuales, cumplen con las especificaciones de operación detalladas en la documentación técnica provista por el fabricante y con las definidas por VETERQUÍMICA S.A.

2 ALCANCE

El presente protocolo de mantenimiento del estado validado de calificación de operación aplica a:

• El Sistema HVAC identificado con el código interno UMA-2 para el área de Inmunológicos, está compuesto por Unidad de Ventilación, código interno [UMA-2], que a través de un sistema de ductos se suministra a 8 salas, de las cuales se encuentran bajo las clasificaciones: Grado C -D / Clase ISO 7 - 8.

Ubicado(a) en: Los Yaciamientos 1175- Maipu, Santiago, Chile.

Sección: Área de Producción Biológica.

3 RESPONSABILIDADES

VETERQUÍMICA S.A. será responsable junto a CERCAL GROUP SPA, designado en la ejecución del presente protocolo.

Es responsabilidad de CERCAL GROUP SPA:

- La redacción del presente protocolo.
- El registro de las pruebas presentes en este protocolo, y su corrección si fuese necesario.
- El registro de las observaciones y cambios detectados durante la ejecución del protocolo.
- La ejecución de las pruebas de revalidación indicadas en el presente protocolo.
- La emisión del Informe final de mantenimiento del estado validado.

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA- Versión: 01	
VETERQUÍMICA S.A.	Página 5 de 27	

Es responsabilidad de los encargados, designados por VETERQUÍMICA S.A.:


La entrega de la información técnica correspondiente al equipo.
 La revisión y aprobación final del presente Protocolo y del Informe de Mantenimiento del Estado Validado.

Es responsabilidad del equipo conjunto VETERQUÍMICA S.A. y CERCAL GROUP SPA:

- La investigación y resolución de los desvíos y no conformidades detectadas durante la ejecución del presente protocolo.

Todas las personas responsables de ejecutar, revisar y aprobar las distintas actividades mencionadas anteriormente deberán registrarse en el cuadro de firmas de responsabilidad, ubicado en la página 2 del presente documento.

4 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

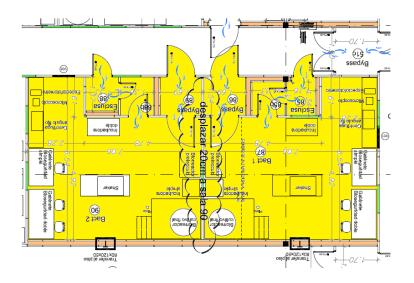

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 6 de 27

5 PROCEDIMIENTOS

5.1 CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA	ESPECIFICACIÓN
Ensayo Nº1: Verificación Tasa de Renovaciones/hora Determinar las tasas de Renovaciones/hora para cada Sala. Ensayo Nº2: Verificación del Grado OMS y la Clase ISO de Limpieza del Aire Realizar medición de conteo de partículas no viables en reposo para cada una de las salas. Ensayo Nº3: Verificación de la presión diferencial. Verificar que se alcanzan y mantienen las	Los resultados de las pruebas contenidas en el informe demuestran que se alcanzan las tasas de renovaciones/hora por cada sala, definidos en las especificaciones de diseño de la instalación, descritas en la Tabla 2: Clasificación de salas. Los resultados de las pruebas contenidas en el informe demuestran que se cumple la normativa de GMP prevista para cada sala descrita en tabla 1. Clasificación de salas. La Presión Diferencial entre salas debe ser como valor mínimo >10 Pa.
presiones diferenciales de diseño entre salas.	Les manifestes de les musches contenides en el
Ensayo №4: Verificación de la Temperatura y Humedad Relativa (%). Verificar que las condiciones ambientales generadas por la estación de climatización están de acuerdo con las especificaciones de diseño.	Los resultados de las pruebas contenidas en el informe cumplen para cada sala: que los valores de temperatura se encuentren entre 12°C-28°C y la Humedad relativa ≤ 75% en las salas.
Ensayo Nº5: Verificación de Luz y Ruido Verificar que el nivel de iluminación y ruido en las salas cumpla con lo especificado	Se debe corroborar el promedio de las mediciones de luz de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2. Promedio de las mediciones de Ruido dBA de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2.

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01	
VETERQUÍMICA S.A.	Página 7 de 27	

5.2 PRUEBAS DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LAS SALAS

Se define las especificaciones de cada sala que componen el Sistema de HVAC, código interno UMA-2 del área de Producción Biológica.

Tabla 1. Detalle de Salas.

N°	Cádigo	Código Área		Namhua da la Oala	Dimensiones		Clasificación Partículas	
Sala	Codigo	Area	Nombre de la Sala	Área (m2)	Volumen (m3)	Grado OMS	Clase ISO	
1	85	Producción Biológica	Esclusa Personal Escalado Bacteriano Nº 1	Esclusa Personal		D	8	
2	85b	Producción Biológica	Esclusa escalado Bacteriano	1.74	4.26	C	7	
3	86	Producción Biológica	Esclusa Materiales Escalado Bacteriano Nº 1	261 639 (C	7	
4	87	Producción Biológica	Escalado Bacteriano Nº 1	39.83	99.97	С	7	
5	88	Producción Biológica	Esclusa Personal Escalado Bacteriano N° 2 1.7 4.4		4.4	D	8	
6	88b	Producción Biológica	Esclusa Escalado Bacteriano N° 2	1.82 4.55		C	7	
7	89	Producción Biológica	Esclusa Materiales Escalado Bacteriano N° 2	2.2	5.6	С	7	
8	90	Producción Biológica	Escalado Bacteriano N°2	38	152	С	7	

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA- Versión: 01	
VETERQUÍMICA S.A.	Página 8 de 27	

Tabla 2. Especificaciones Técnicas.

N° Sala	Código	Área	Nombre de Sala	Presión Diferencial, Pa	Renovacio nes, Ren/hr	Tempera tura °C	Humedad Relativa %	Luz, Lux	Ruido, dBA
1	85	Producci ón Biológica	Esclusa Personal Escalado Bacteriano N° 1	10	10	12 a 28	≥75	>150	<85
2	85b	Producci ón Biológica	Esclusa escalado Bacteriano	10	20	12 a 28	≥75	>20	<85
3	86	Producci ón Biológica	Esclusa Materiales Escalado Bacteriano N° 1	10	20	12 a 28	≥75	>150	<85
4	87	Producci ón Biológica	Escalado Bacteriano Nº 1	10	20	12 a 28	≥75	>500	<85
5	88	Producci ón Biológica	Esclusa Personal Escalado Bacteriano N° 2	10	10	12 a 28	≥75	>150	<85
6	88b	Producci ón Biológica	Esclusa Escalado Bacteriano N° 2	10	20	12 a 28	≥75	>150	<85
7	89	Producci ón Biológica	Esclusa Materiales Escalado Bacteriano N° 2	10	10	12 a 28	≥75	>150	<85
8	90	Producc ión Biológic a	Escalado Bacteriano N°2	10	20	12 a 28	≥75	>500	<85

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 9 de 27

Ensayo Nº1: Verificación Tasa de Renovaciones/hora

Metodología del Ensayo:

Para la realización de las pruebas se aplica el siguiente procedimiento:

- En las salas con difusores de suministro se debe obtener el valor del caudal en (m3/h) directamente utilizando un Balómetro que mide caudal para su determinación.
- Los datos obtenidos de caudales quedaran como datos de carácter informativo.
- Obtener la tasa de renovaciones/hora usando la siguiente ecuación:

TASA DE RENOVACIONES/HORA = Caudal suministro total (m3 /h) /volumen de la sala (m3)

- A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos referenciadas por el código y nombre de la sala. Dichos registros se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.
- Para aquellas salas asociadas a colectores de polvo se hará adicionalmente la verificación del estado con el equipo encendido y apagado.

N°	Ítem a Verificar	Especificación	Cumple	Firma	Fecha		
1	Verificación de tasa de renovación	Cumple con lo especificado en la Tabla 2: Especificaciones de salas.	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021		
Desviaciones: ☐ Si ☒ No N:A S.CamachoR 17.12.2021							
Documentación Complementaria: Informes Salas Limpias							
Resultado: CUMPLE ☑ NO CUMPLE □ NO APLICA □							
Elabor	ado por: Sofia Camach	10	Verificado por:				

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 10 de 27

Firma: S.CamachoR	Firma:
Fecha: 17.12.2021	Fecha:

ENSAYO DE EJECUCIÓN:

Equipo/Instrumento: _Balometro_____

Certificado Calibración: _CRT-EBT-731844005-21-3

Tabla 3. Tasa Renovaciones							
Código Sala	Nombre Sala	Especificado, Ren/h	Valor Obtenido	Cumple SI/NO	Firma	Fecha	
85	Esclusa Personal Escalado Bacteriano N° 1	≥10	140.4	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021	
85b	Esclusa escalado Bacteriano	≥20	57.0	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021	
86	Esclusa Materiales Escalado Bacteriano N° 1	≥20	38.9	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021	
87	Escalado Bacteriano Nº 1	≥20	38.6	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021	
88	Esclusa Personal Escalado Bacteriano N°	≥10	68.0	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021	
88b	Esclusa Escalado	≥20	69.3	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021	

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 11 de 27

	Bacteriano N° 2					
89	Esclusa Materiales Escalado Bacteriano N°	≥20	31.3	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
90	Escalado Bacteriano N°2	≥20	35.2	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021

Ensayo Nº2: Verificación de la Clase ISO de Limpieza del Aire

Metodología del Ensayo:

Se debe realizar el conteo de partículas "At rest".

- Se entiende por "at Rest" cuando la planta está sin presencia de personal de producción, pero con todo el equipo de producción instalado y en funcionamiento. Se deben registrar las máquinas que estén en funcionamiento y las maquinas que están paradas durante la realización del test.
- El número de puntos de muestreo en sala será determinado en función de la superficie y el grado de limpieza de la misma según la norma ISO 14644- 1:2015.
- Se debe colocar la sonda isocinética en posición vertical a una altura aproximada de un metro del suelo (aproximadamente a la altura de trabajo). Para realizar la toma de muestra ("At rest") se procederá como sigue:
- Poner en marcha el contador de partículas de acuerdo al modo de Certificación GMP, midiendo los puntos y muestras establecidas en el programa. Los resultados se registrarán en el voucher que entregara el equipo al finalizar la medición (datos crudos) de cada sala evaluada, identificada por Código y nombre de la Sala. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.

Criterio de Aceptación: Los resultados de las pruebas contenidas en el informe demuestran que se cumple la normativa de GMP prevista para cada sala descrita en tabla 1. Clasificación de salas.

ISO 14644- 1:2015.							
	Clasificación	0.5 μm 5.0 μm					
7		352.000		2.930		2.930	
	8	3.5	20.000	0 29.300		29.300	
N°	Ítem a Verificar	Especificación	ificación Cump		Firma	Fecha	
1	Verificación de Clase.	Cumple con lo especificado en la tabla 1	⊠ Si □ No		S.CamachoR	17.12.202	

N.A

PROTOCOLO	DE MANTENIMIEN VALIDACIÓN DEL	Protocolo: SCL-P Versión: 01	C-VET-MEV UMA-		
VETERQUÍMICA S.A.					a 12 de 27
		Clasificación de salas.			
Desviaciones	s: 🗆 Si 🖾 No				
Documentac	ión Complementaria	a: Informes de Salas Li	mpias		
Resultado:	CUMPLE ☒	NO CUMPLE [NO APLICA [
Ensayo Nº2:	Verificación de la C	clase ISO de Limpieza d	lel Aire		
Elaborado po	or: Sofia Camacho		Verificado por:		
Firma: S.CamachoR		Firma:			
Fecha: 17.12.2021			Fecha:		
EJECUCIÓN D	E ENSAYO:				

Equipo/Instrumento:	_Contador
---------------------	-----------

Certificado Calibración: __CRT-95356-21-3_____

	Tabla 4. Prueba de Conteo de Partículas en "At Rest"							
Código	Nombre Sala	ISO 14644- 1:2015		Cumple	D:	Factor		
Sala	Nombre Sala	0.5 µm	5.0 µm	SI/NO	Firma	Fecha		
85	Esclusa Personal Escalado Bacteriano N°1	1748	88	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021		
85b	Esclusa escalado Bacteriano	6146	336	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021		
86	Esclusa Materiales Escalado Bacteriano N° 1	600	53	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021		
87	Escalado Bacteriano Nº 1	549	74	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021		
88	Esclusa Personal	8511	388	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021		

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 13 de 27

	Escalado Bacteriano Nº 2					
88b	Esclusa Escalado Bacteriano N° 2	1201	71	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
89	Esclusa Materiales Escalado Bacteriano N° 2	3337	124	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
90	Escalado Bacteriano N°2	1282	88	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021

Ensayo Nº3: Verificación de la Presión Diferencial

Metodología del Ensayo:

Para la realización de las pruebas se determinará la presión dentro de la sala con respecto a la sala contigua, utilizando un manómetro diferencial debidamente calibrado.

- Se debe comprobar que las puertas de todas las salas involucradas con el sistema HVAC estén cerradas.
- Los valores de presión se deben tomar utilizando las tomas colocadas en el techo, si existe.
- Si no es posible ejecutar el ensayo de la forma indicada anteriormente, se debe medir la diferencia de presiones entre salas por debajo de las puertas.
- A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificadas por código interno y nombre específico. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.

N°	Ítem a Verificar	Especificación	Cumple	Firma	Fecha
1	Verificación de la presión diferencial.	Cumple con lo especificado en la Tabla 2:	□ Si 🏿 No	S.CamachoR	17.12.2021

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE VALIDACIÓN DEL SISTE	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01						
VETERQUÍMICA S.A.				a 14 de 27			
Especificaciones de salas.							
Desviaciones: ☒ Si ☐ No Al realizar las mediciones de las salas h N.A S.CamachoR 17.12.2021		e no cumplieron cor	ı las especifica	aciones pedidas.			
Documentación Complementaria: Infor	mes de Salas	Limpias					
Instrumento de Medición: Balometro co	on Sonda						
Resultado: CUMPLE □ NO CUMPLE ⊠ NO APLICA □							
Elaborado por: Sofia Camacho		Verificado por:					
Firma: S.CamachoR		Firma:					

Fecha:

EJECUCIÓN DE ENSAYO:

Fecha: 17.12.2021

Equipo/Instrumento: ___Balometro con sonda _____

Certificado Calibración: _CRT-EBT-731844005-21-3_

	Tabla 5. Verificación de Diferencial de Presión									
Código Sala	Nombre Sala	Código Sala Adyacente	Valor Especificado, Pa	Valor Obtenido, Pa	Cumple SI/NO	Firma	Fecha			
	Esclusa Personal	Sala 62		1.24	□ Si ⊠ No					
85	Escalado Bacteriano N° 1	Sala 85b	Mín. 10	10.8	NO	S.CamachoR	17.12.2021			
0.E.b	Esclusa escalado	Sala 85	Mín. 10	10.8	⊠ Si □	C Como ch a D	17.12.2021			
85b	Bacteriano	Sala 87	IVIIII. IU	13.6	No	S.CamachoR	17.12.2021			

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01	
VETERQUÍMICA S.A.	Página 15 de 27	

	Esclusa Materiales	Sala 87		3.74	□ Si 🏻	S.CamachoR	17.12.2021
86	Escalado Bacteriano N° 1	Sala 62	Mín. 10	0.5	No		
	Escalado	Sala 86		3.74	☐ Si 🏻		4= 40 0004
87	Bacteriano Nº 1	Sala 85b	Mín. 10	13.6	No	S.CamachoR	17.12.2021
88	Esclusa Personal	Sala 88b	Min 10	26.1	⊠ Si □	S.CamachoR	17.12.2021
00	Escalado Bacteriano N° 2	Sala 62	Mín. 10	14.8	No		
	Esclusa Escalado	Sala 90		21.4	- ⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
88b	Bacteriano N° 2	Sala 88	Mín. 10	26.1			
	Esclusa Materiales	Sala 90		26.29	- □ Si ⊠ No		
89	Escalado Bacteriano N° 2	Sala 62	Mín. 10	5.71		S.CamachoR	17.12.2021
00	Escalado	Sala 88b	M/ 10	21.4	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
90	Bacteriano N°2	Sala 89	Mín. 10	26.2			

Ensayo Nº4: Verificación de la Temperatura y Humedad Relativa (%).

Metodología del Ensayo:

Para la realización de las pruebas, se toman diversas medidas de temperatura y humedad relativa en las salas a la altura de trabajo.

Se medirán 5 puntos de temperatura y 5 puntos de humedad relativa.

- Equipos necesarios: Equipo de determinación de temperatura y humedad relativa (Termohigrómetro).
- A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificadas respectivamente por código y nombre de sala. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.

N°	Ítem a Verificar	Especificación	Cumple	Firma	Fecha
----	------------------	----------------	--------	-------	-------

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 16 de 27

1	Verificación de la Temperatura.	Cumple con una Temperatura 12°C- 28°C	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021		
2	Cumple con Verificación de una humedad		⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021		
Desvia	nciones: Si 🛮 No	imachoR17.12.2	021				
Docum	nentación Compleme	entaria: Informes	de Salas Limpias				
Instru	mento de Medición:	Sensor de Tempe	eratura y Humedad				
Result	Resultado: CUMPLE ☑ NO CUMPLE □ NO APLICA □						
Elabor	ado por: Sofia Cama	cho	Verificado por:				
Firma:	S.CamachoR		Firma:				
Fecha:	17.12.2021		Fecha:				

EJECUCIÓN DE ENSAYO:

Equipo/Instrumento: _Sensor de Temperatura y Humedad

Certificado Calibración: _CRT-EBT-731844005-21-3____

Tabla 6. Verificación de Temperatura y Humedad Relativa (%) de la Sala.							
Código Sala	Nombre Sala	Temperatura Obtenida °C	Humedad Relativa Obtenida %	Cumple SI/NO	Firma	Fecha	

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 17 de 27

85	Esclusa Personal Escalado Bacteriano N° 1	19.5	49.2	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
85b	Esclusa escalado Bacteriano	19.2	49.7	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
86	Esclusa Materiales Escalado Bacteriano N° 1	19.2	49.7	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
87	Escalado Bacteriano Nº 1	19.1	47.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
88	Esclusa Personal Escalado Bacteriano N° 2	19.1	58.4	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
88b	Esclusa Escalado Bacteriano N° 2	19.0	58.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
89	Esclusa Materiales Escalado Bacteriano N° 2	18.8	60.1	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
90	Escalado Bacteriano N°2	19.5	42.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021

Ensayo Nº5: Verificación de Luz y Ruido

Objetivo: Verificar que el nivel de iluminación y ruido en las salas cumpla con lo indicado en DS N°594.

Metodología del Ensayo:

Se debe utilizar un medidor de luz y un medidor de ruido debidamente calibrado para determinar la iluminación y ruido de cada sala.

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01		
VETERQUÍMICA S.A.	Página 18 de 27		
- A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos	(datos crudos) de cada sala		
evaluada en hojas de datos identificados por código y nombre de sala. Dichas hojas se adjuntarán al			
informe final formando parte de los anexos de este protocolo.	,		
	. •		

- La medición del ruido queda registrada dentro del protocolo como informativo. Criterio de aceptación: Promedio de las mediciones de luz de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2 Promedio de las mediciones de Ruido dBA de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2 N° Ítem a Verificar Fecha Especificación Cumple Firma Cumple con lo Verificación de especificado en la Tabla ⊠ Si □ No 1 S.CamachoR 17.12.2021 Iluminancia 2. Especificaciones de salas. Cumple con lo Verificación de especificado en la Tabla ☑ Si ☐ No 2 S.CamachoR 17.12.2021 Ruido 2. Especificaciones de salas. Desviaciones: ☐ Si ☒ No N::A S.CamachoR 17.12.2021 Documentación Complementaria: Informes de Salas Limpias Instrumento de Medición: Luxómetro y Sonómetro CUMPLE X NO CUMPLE □ Resultado: NO APLICA □ Elaborado por: Sofia Camacho Verificado por: Firma: S.CamachoR Firma: Fecha: 17.12.2021 Fecha:

EJECUCIÓN DE ENSAYO:

]	Equipo/	Instrumento:	Luxómetro	

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2
VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 19 de 27

Certificado Calibración: __20200617_____

	Tabla 7. Verificación de Luz en Salas.					
Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificado, de LUX	Valor Obtenido, LUX	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
85	Esclusa Personal Escalado Bacteriano N° 1	<u>></u> 150	301.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
85b	Esclusa escalado Bacteriano	<u>></u> 20	354.4	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
86	Esclusa Materiales Escalado Bacteriano N° 1	<u>></u> 150	280.2	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
87	Escalado Bacteriano N° 1	<u>></u> 500	528.6	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
88	Esclusa Personal Escalado Bacteriano N° 2	<u>></u> 150	410.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
88b	Esclusa Escalado Bacteriano N° 2	<u>></u> 150	371.0	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
89	Esclusa Materiales Escalado Bacteriano N° 2	<u>></u> 150	409.6	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
90	Escalado Bacteriano N°2	<u>></u> 500	492.6	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021

Equipo/Instrumento:S	onometro
----------------------	----------

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2
VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 20 de 27

Certificado Calibración: __20200617-A_____

	Tabla 8. Verificación de Ruido en Salas (carácter informativo)					
Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificado, de dBA	Valor Obtenido, dBA	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
85	Esclusa Personal Escalado Bacteriano N°1	≤85	32.3	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
85b	Esclusa escalado Bacteriano	≤85	36.1	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
86	Esclusa Materiales Escalado Bacteriano N° 1	≤85	33.2	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
87	Escalado Bacteriano Nº 1	≤85	34.3	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
88	Esclusa Personal Escalado Bacteriano N° 2	≤85	40.7	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
88b	Esclusa Escalado Bacteriano N° 2	≤85	45.3	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
89	Esclusa Materiales Escalado Bacteriano N°	≤85	40.5	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
90	Escalado Bacteriano N°2	≤85	52.3	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 21 de 27

5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para cada una de las variables medidas en cada uno de los ensayos de revalidación se realizará la comparación directa con las especificaciones definidas y se dará el concepto de la prueba.

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El criterio de aceptación para las fases propuestas de revalidación define que todos los requerimientos sean cumplidos o si se presenta algún incumplimiento, éste sea investigado y justificado plenamente. De lo contrario, proceder como se describe en MANEJO DE DESVIACIONES.

7. REPORTE RESUMEN

Una vez concluido el proceso de Mantenimiento del Estado Validado del Sistema HVAC UMA-2, se elaborará un informe de cierre que describirá el análisis de los datos y los resultados obtenidos.

Deben contener:

Nombre del sistema revalidado y protocolo de referencia

Resultados de las pruebas de mantenimiento del estado validado del sistema: Se debe mostrar el resultado, el criterio de aceptación y el concepto de cumplimiento.

Firmas de cierre de fase de recalificación.

8. MANEJO DE DESVIACIONES

Objetivo: Hacer un listado de todas las desviaciones encontradas durante la ejecución del documento de revalidación del sistema. También hay que confirmar que todas las desviaciones hayan sido resueltas y aprobadas.

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 22 de 27

Método: Escribir en la tabla cualquier desviación encontrada durante la ejecución del documento de revalidación.

Incluir una breve descripción de la desviación y número asignado al formulario de investigación de dicha desviación. Todos los formularios de investigación de desviaciones deben ser anexados a este documento de calificación, según Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas SOP0004.

Luego de resolver y aprobar la desviación, se debe consignar en la columna de "Desviación cerrada" la firma y fecha por la persona que está llenando los datos de esta revalidación.

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 23 de 27

EODMATO DADA MANIEJO DE DESVIACIONES DE VALIDACIONES V.CALIEJCACIONES

FORMATO PARA MANEJO DE DESVIACIONES DE VALIDACIONES Y CALIFICACIONES				
Protocolo de Validación N°:SCL-PC-VET-MEV-UMA-2 Título del Protocolo: _Protocolo de Mantenimiento de Estado Validado para la validación del Sistema				
HVAC UMA-2_	10F10t0coto de Manteninilento de Estado Validado para te	i validacion dei distema		
REPORTE DE DES	SVIACIÓN N°: _1 Página _1	de2		
	Etapa de Calificación o Validación:			
Dise	ño □ Instalación □ Operación 図 Deser	mpeño □		
Descripción de la	Desviación:			
Fecha: _17.12.202	21 Firma: _S.CamachoR			
Clasificación de la Desviación	Acciones	Observaciones		
	Descripción de la justificación:			
□ No Crítica	Fecha: Firma:			
	Descripción de la justificación:	No Cumple el Ensayo		
🛚 Crítica	En la realización del protocolo unas salas no cumplen con las especificaciones	Nº3: Verificación de la Presión Diferencial la salas 85,86,87 y 89		
	Fecha:17.12.2021 Firma: _S.CamachoR			
¿Las correcciones realizadas fueron suficientes para remediar la desviación (SI/NO)? Fecha: Firma:				
¿Se requiere la aplicación del procedimiento de acciones correctivas y preventivas? (SI/NO):				
Evaluado y Aprobado por:				
Cargo: Fecha:				

	MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA LIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01
	VETERQUÍMICA S.A.	Página 24 de 27
Aprobado por:	Cargo:	Fecha:
	ARA MANEJO DE DESVIACIONES DE VALIDACIONES	/
Protocolo de Vali	dación N°:	/
	olo:	
REPORTE DE DE	SVIACIÓN N°: Págin	a de
Dise	Etapa de Calificación o Validación: eño □ Instalación □ Operación □ I	Desempeño □
Descripción de la Fecha:	Desviación: Firma:	
Clasificación de la Desviación	Acciones	Observaciones
□ No Crítica	Descripción de la justificación: Fecha: Fecha: Figura:	_
□ Crítica	Descripción de la justificación: Fecha: Firma:	
	s realizadas fueron suficientes para remediar la desvia Firma:	ación (SI/NO)? Fecha:
¿Se requiere l (SI/NO):	a aplicación del procedimiento de acciones co	orrectivas y preventivas?

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 25 de 27

Evaluado y Aprobado por:			
Cargo:		Fecha:	
Aprobado por:	Cargo:	Fecha:	

9. BIBLIOGRAFÍA

- WHO Technical Report Series 908, 2003 (Informe 37)
- WHO Technical Report Series 961, 2011 (Informe 45)
- Norma UNE-EN-ISO 14644-1: Salas limpias y locales anexos, Parte 1: Clasificación de la limpieza del aire.
- · Norma UNE-EN-ISO 14644-3: Salas limpias y locales anexos, Parte 3: Métodos de ensayos
- \cdot EN 779:1993 Y EN 1822. ESPECIFICACIONES PARA FILTROS DE PARTICULAS EN SISTEMAS DE VENTILACION (EN 779 (G y F) & EN1822 (H y U)
- ISPE Guías para diseño de sistemas de ventilación y aire acondicionado para Industria Farmacéutica
- · ASHRAE: Guías diseño de áreas limpias.

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 26 de 27

10. ANEXOS

CONTROL DE CAMBIOS DEL SCL-PC-VET-MEV UMA-2

FECHA	RAZÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	ACTUALIZACIÓN N°
		2021	
		pachoR 17.12.2021	
	NA SCA		

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-2	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-2 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 27 de 27
